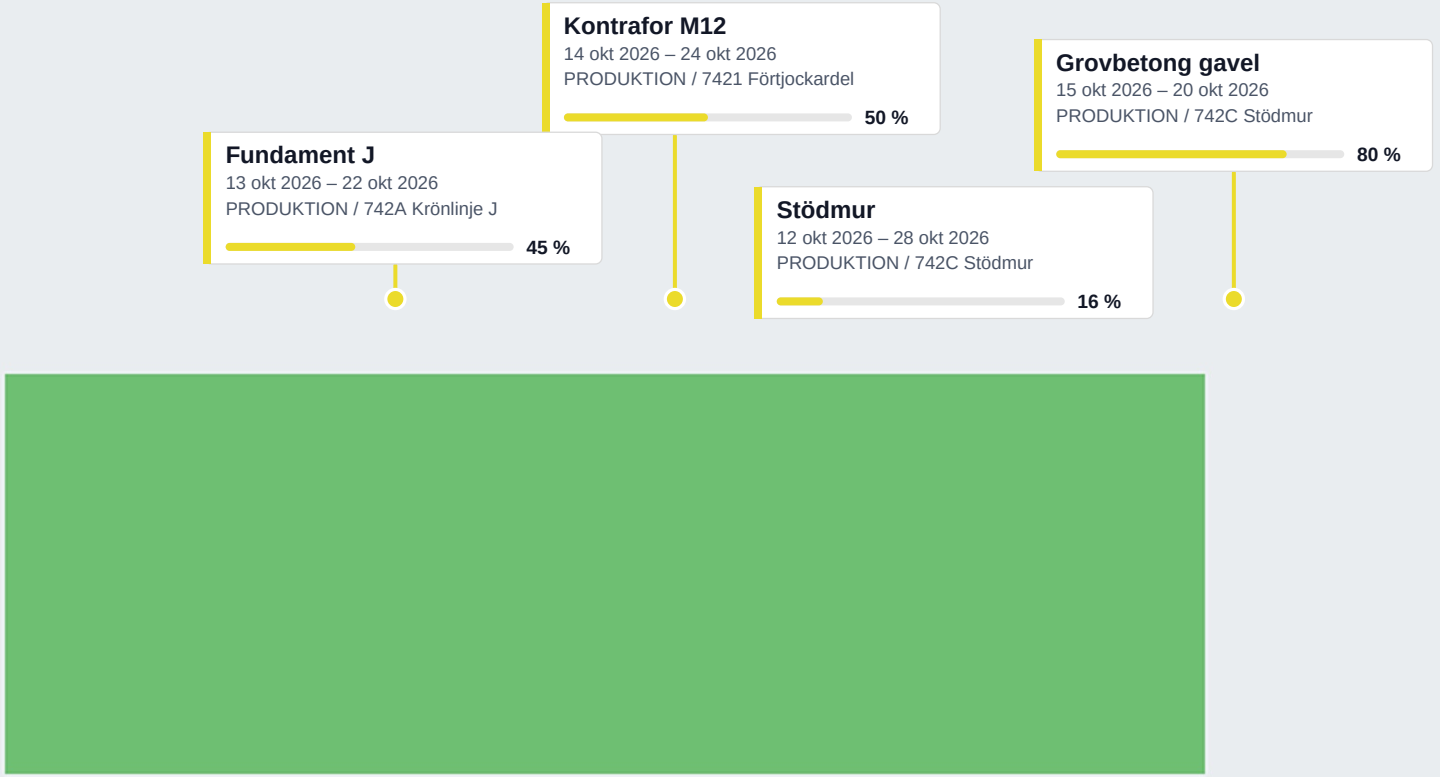
Kontrafor M12
14 okt 2026 – 24 okt 2026
PRODUKTION / 7421 Förtjockardel
50 %
Grovbetong gavel
15 okt 2026 – 20 okt 2026
PRODUKTION / 742C Stödmur
80 %
Fundament J
13 okt 2026 – 22 okt 2026
PRODUKTION / 742A Krönlinje J
45 %
Stödmur
12 okt 2026 – 28 okt 2026
PRODUKTION / 742C Stödmur
16 %
